



Willkommen bei der Craftboxx Vorstellung am 29.02.2024

Fensterbau organisieren - mit der Craftboxx

Für Android, iPhone und iPad  CRAFTBOXX

Jetzt kostenlos testen →



Die Handwerkersoftware für den Fensterbau

Planung und Ausführung leicht gemacht - mit der Handwerkersoftware Craftboxx kannst du deine Arbeitsabläufe nahezu vollständig digitalisieren.

Bei der Entwicklung der Software haben wir wert darauf gelegt, dir zentrale Funktionen ohne Schnickschnack leicht zugänglich zu machen. Mit unserer digitalen Planetafel, der Möglichkeit, Arbeitsergebnisse zu dokumentieren

Agenda

1. Vorstellung meiner Person
2. Was ist die Craftboxx
3. Geplant.
4. Erfasst.
5. Geschafft.
6. Überzeugt euch selbst!



Vorstellung meiner Person



Kundenmanager &
euer persönlicher Ansprechpartner

Geplant.

Craftboxx Auftragsliste Planung Auswertung Mitarbeiter Stammdaten Adminbereich

Aufträge


235 Tage verbleibend [Vollversion bestellen](#)

Alle (6) Nicht terminiert (1) Terminiert (5) In Bearbeitung (0) Pausiert (0) Aktion erforderlich (0) Fertig (0) Alles Fertig (0) Archiv

Nr.	Auftragsname	Termine	Kunde / Einsatzort & Kont...	Zeitraum	Labels	Mitarbeiter	Angelegt
A-0006	Grundstücksgesellschaft Grüntal	1	Frau Zimmermann Grundst... Calvinstraße 20, 10557 Berlin - ...		1 3 3	FS HG JM JB	Heute
A-0005	Großbaustelle: Groningstraße	5	Herr Ing. Walter Walters In... Gröningstraße, 48432 Rheine - ...	28.02.2024, 06:00 - 27.03.2024, 16:00	5 5 5	FS HG JV JM +2	Heute
A-0004	Fenster Reparatur	1	Herr Schulte (K-0004) Franz-Josef-Strauß Straße 2, 21...	26.02.2024 08:00 - 10:00	1	HG	Heute
A-0003	Service Frau Neukolt	1	Frau Neukolt (K-0003) Radebergstraße 20, 23738 Lens...	26.02.2024 08:00 - 10:00	1	FS	Heute
A-0002	Hausbau Franz Meyer	5	Herr Meyer (K-0002) Großhandelsring 15, 49084 Os...	26.02.2024, 08:00 - 01.03.2024	1 1 1 1 +1 mehr	DS HG JV JM +1	Heute
A-0001	Fensterbau Fachtagung	2	Herr Kemner Ingenieurbür... Wellingholzhausener Straße 7, ...	29.02.2024 05:00 - 16:00	2 2	MK	Heute

Zeige 25 pro Seite [Exportieren](#)

Geplant.

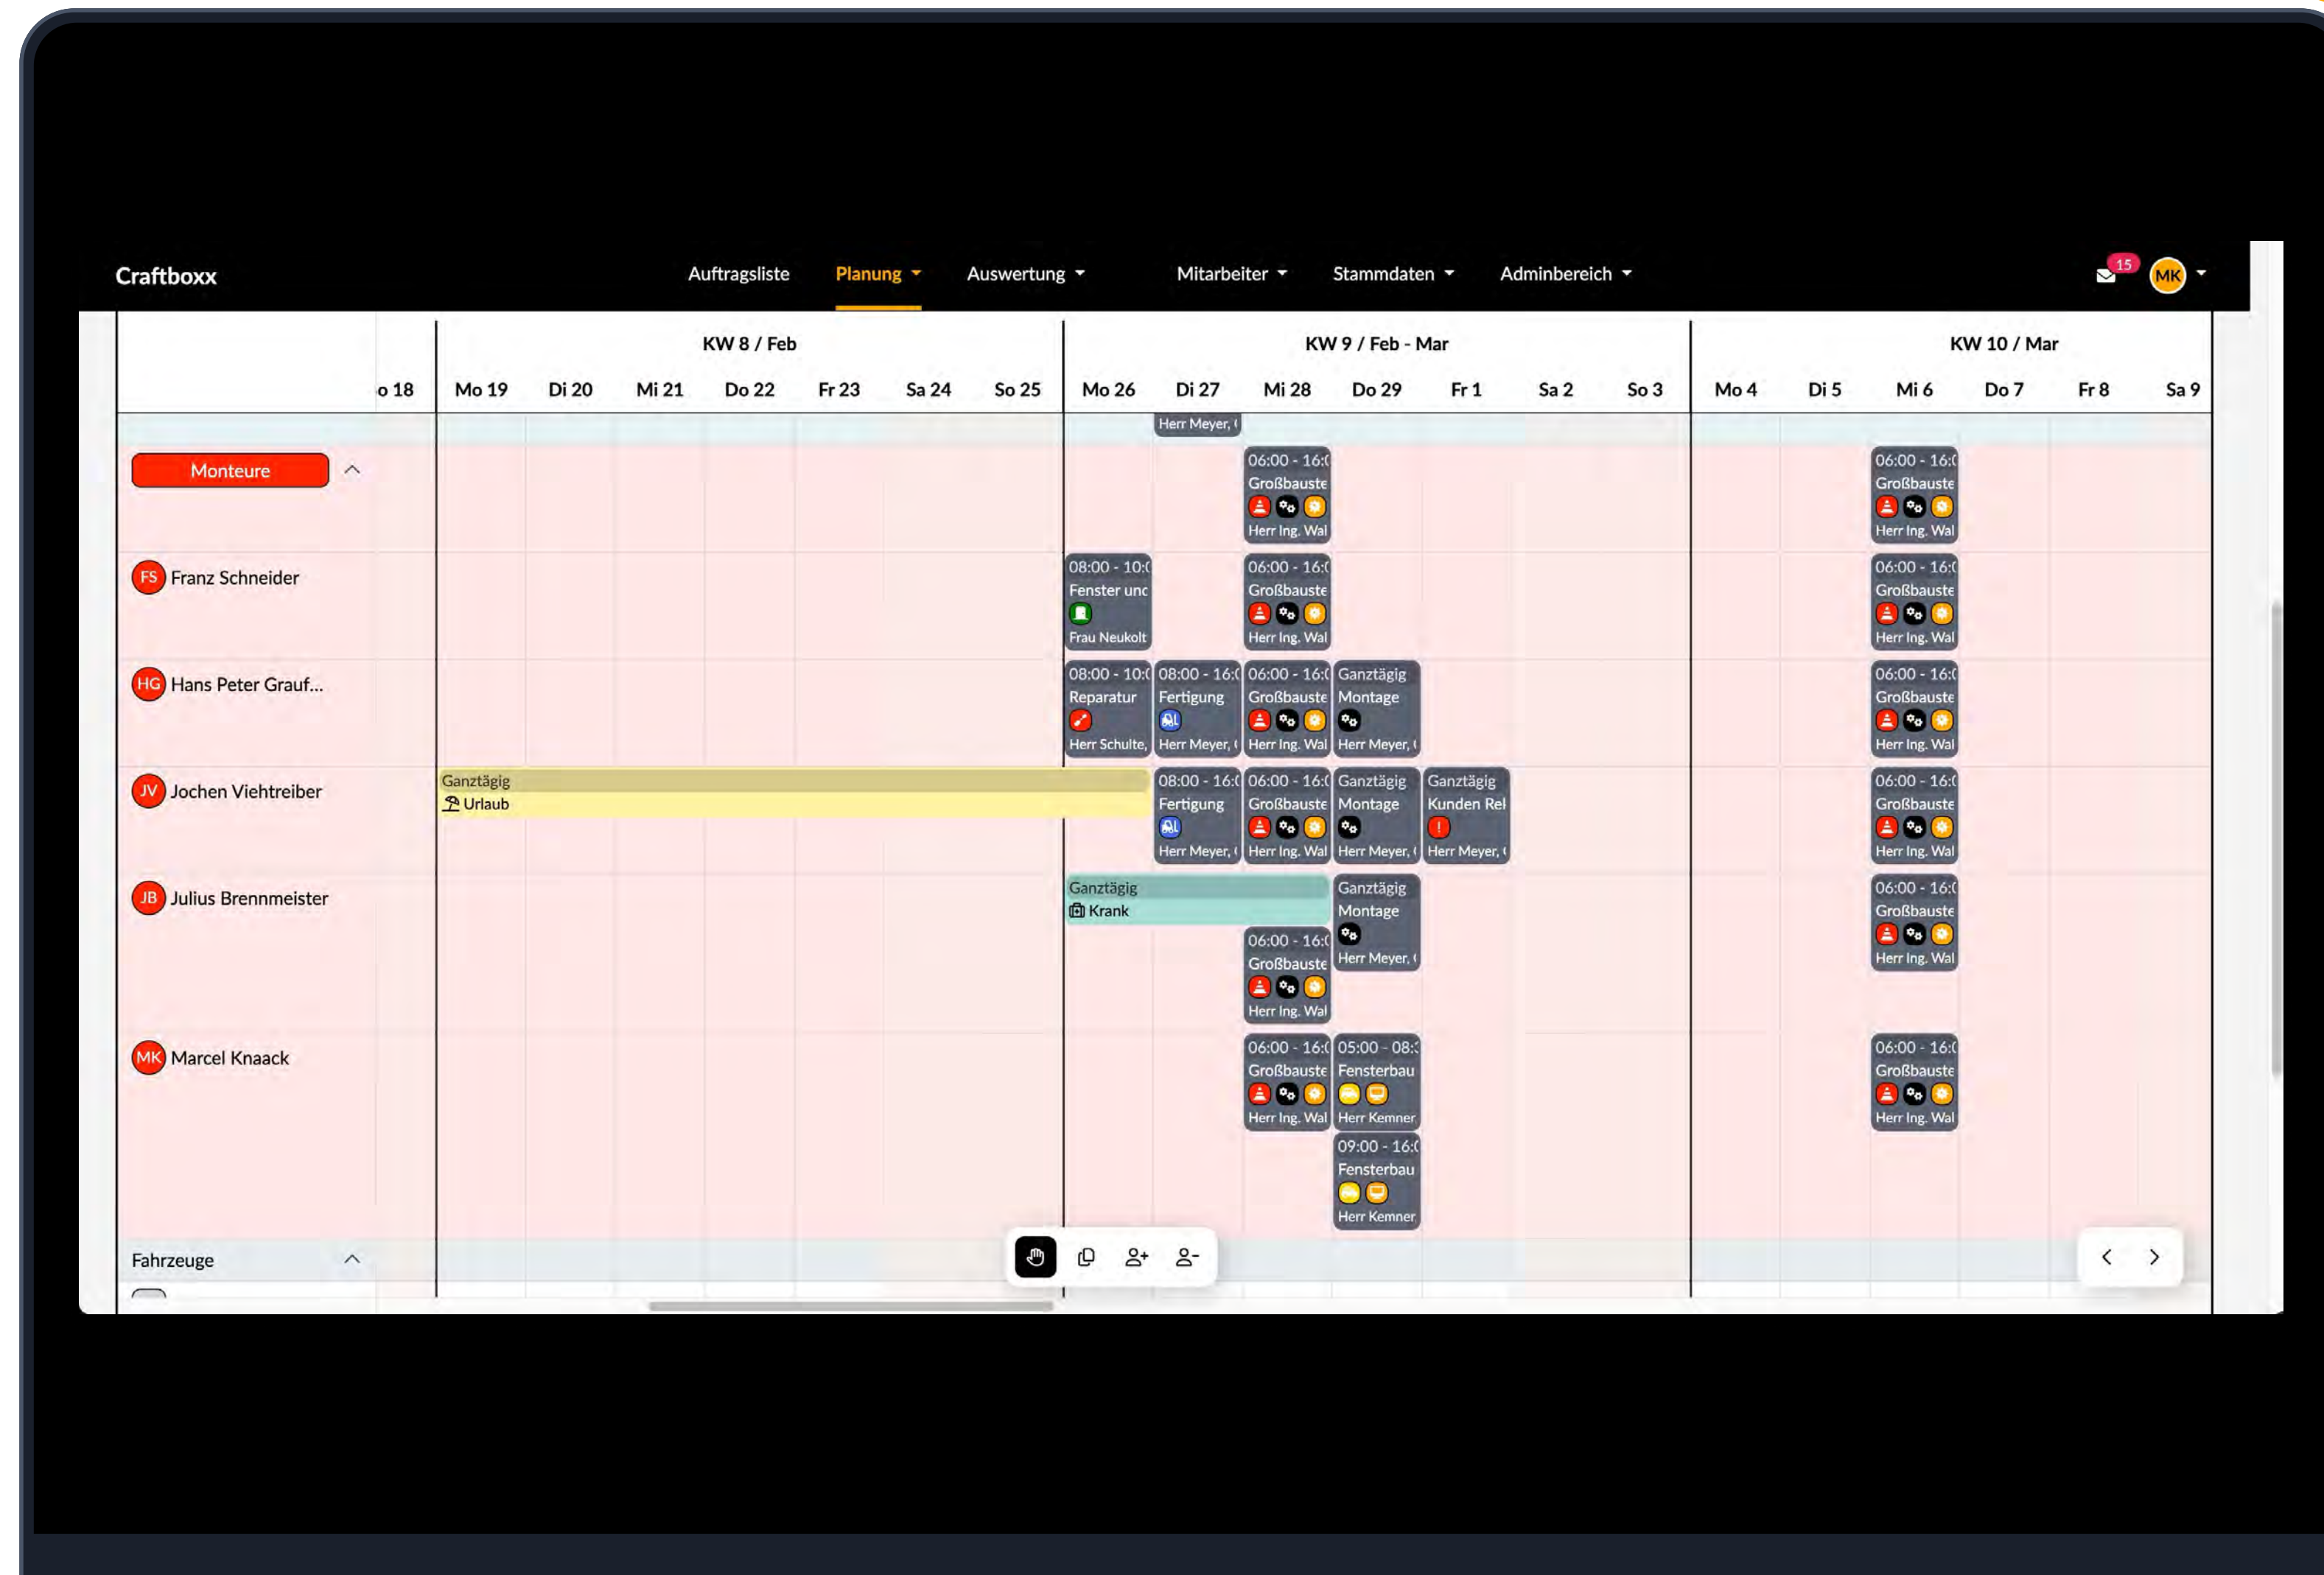

Geplant.


Craftboxx Auftragsliste **Planung** Auswertung Mitarbeiter Stammdaten Adminbereich 15 MK

	KW 8 / Feb							KW 9 / Feb - Mar							KW	Nicht terminiert (4)	
	Mo 19	Di 20	Mi 21	Do 22	Fr 23	Sa 24	So 25	Mo 26	Di 27	Mi 28	Do 29	Fr 1	Sa 2	So 3			Mo 4
BF Beate Friedensbrü...									09:00 - 09:30 Fenster + Ti Herr Meyer, f								
DS Daniela Schönfelde																	
Monteure																	
FS Franz Schneider								08:00 - 10:00 Fenster unc Frau Neukolt		06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal						06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal	
HG Hans Peter Grauf...							08:00 - 10:00 Reparatur Herr Schulte	08:00 - 16:00 Fertigung Herr Meyer, f	06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal	Ganztägig Montage Herr Meyer, f						06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal	
JV Jochen Viehtreiber							Ganztägig Urlaub	08:00 - 16:00 Fertigung Herr Meyer, f	06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal	Ganztägig Montage Herr Meyer, f	Ganztägig Kunden Rel Herr Meyer, f					06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal	
JB Julius Brennmeister							Ganztägig Krank			Ganztägig Montage Herr Meyer, f						06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal	
MK Marcel Knaack									06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal		05:00 - 08:00 Fensterbau Herr Kemner					06:00 - 16:00 Großbauste Herr Ing. Wal	




Nicht terminiert (4)

- 4h 0m Montagetermine Frau Zimmermann, Grüntaler Grundst
- 4h 0m Montagetermine Frau Zimmermann, Grüntaler Grundst
- 4h 0m Montagetermine Frau Zimmermann, Grüntaler Grundst
- Ohne Dauer Wohngebäude 1: Aufmaß Frau Zimmermann, Grüntaler Grundst

Geplant.

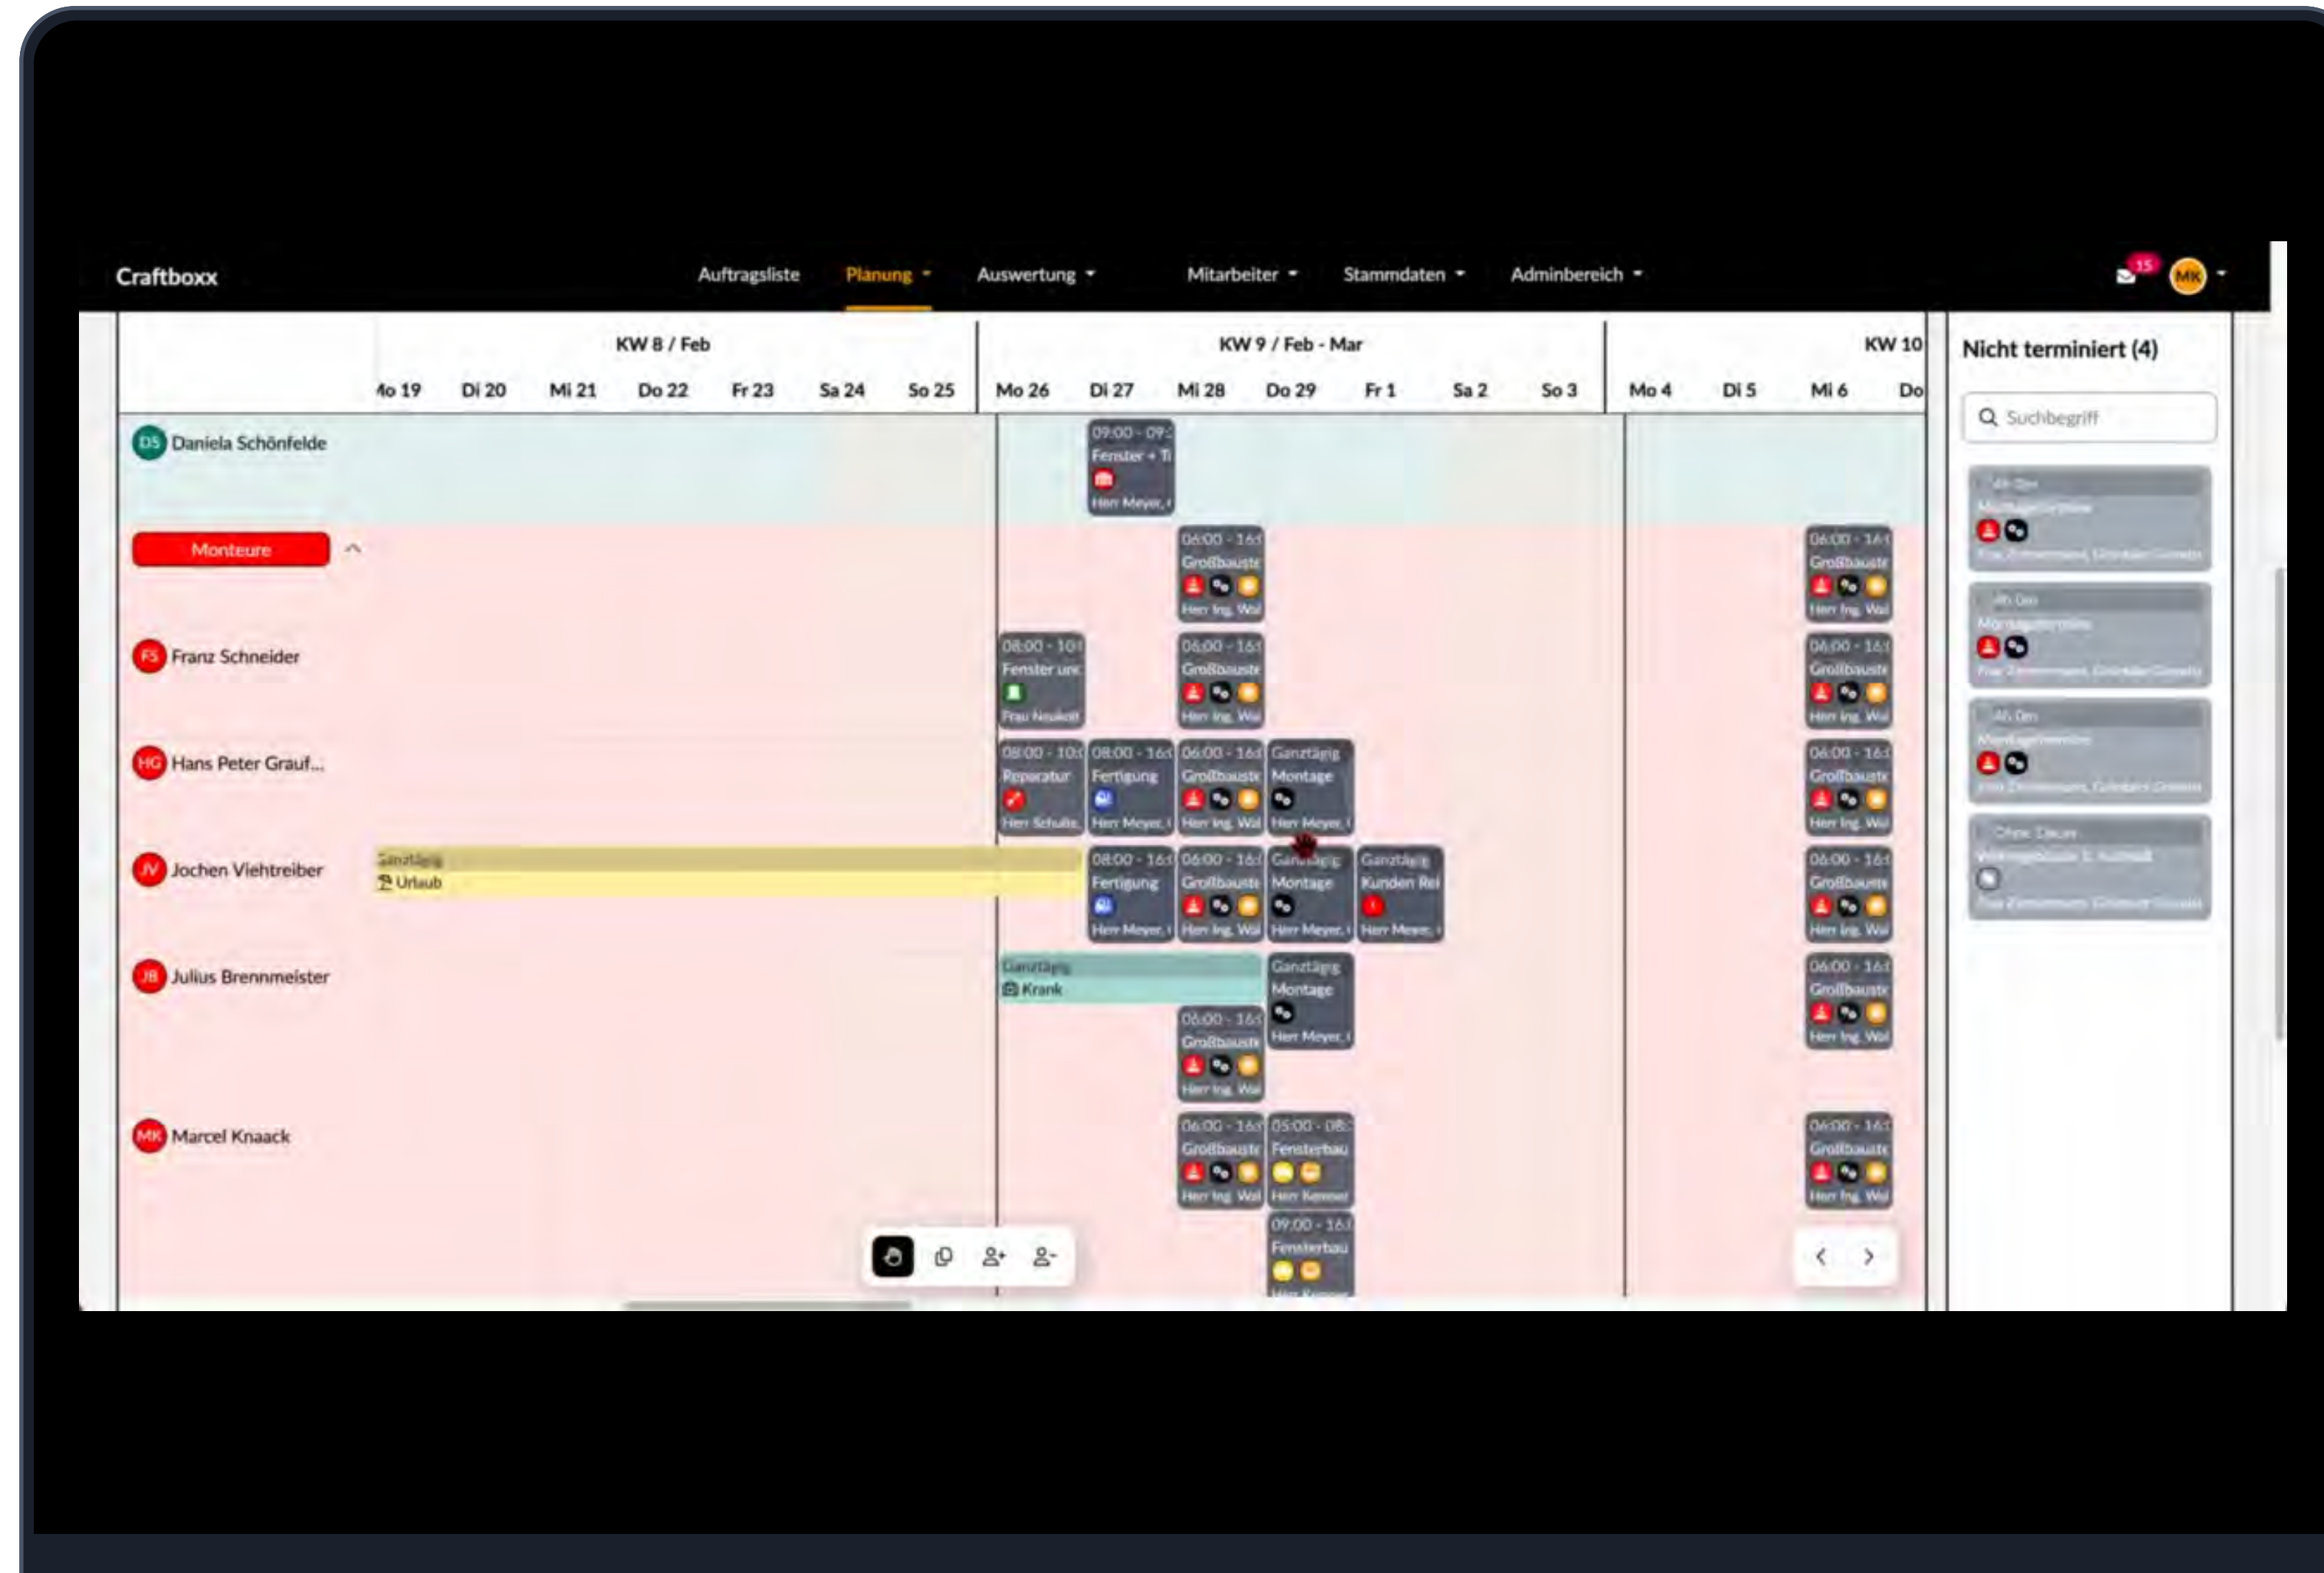

Erfasst.

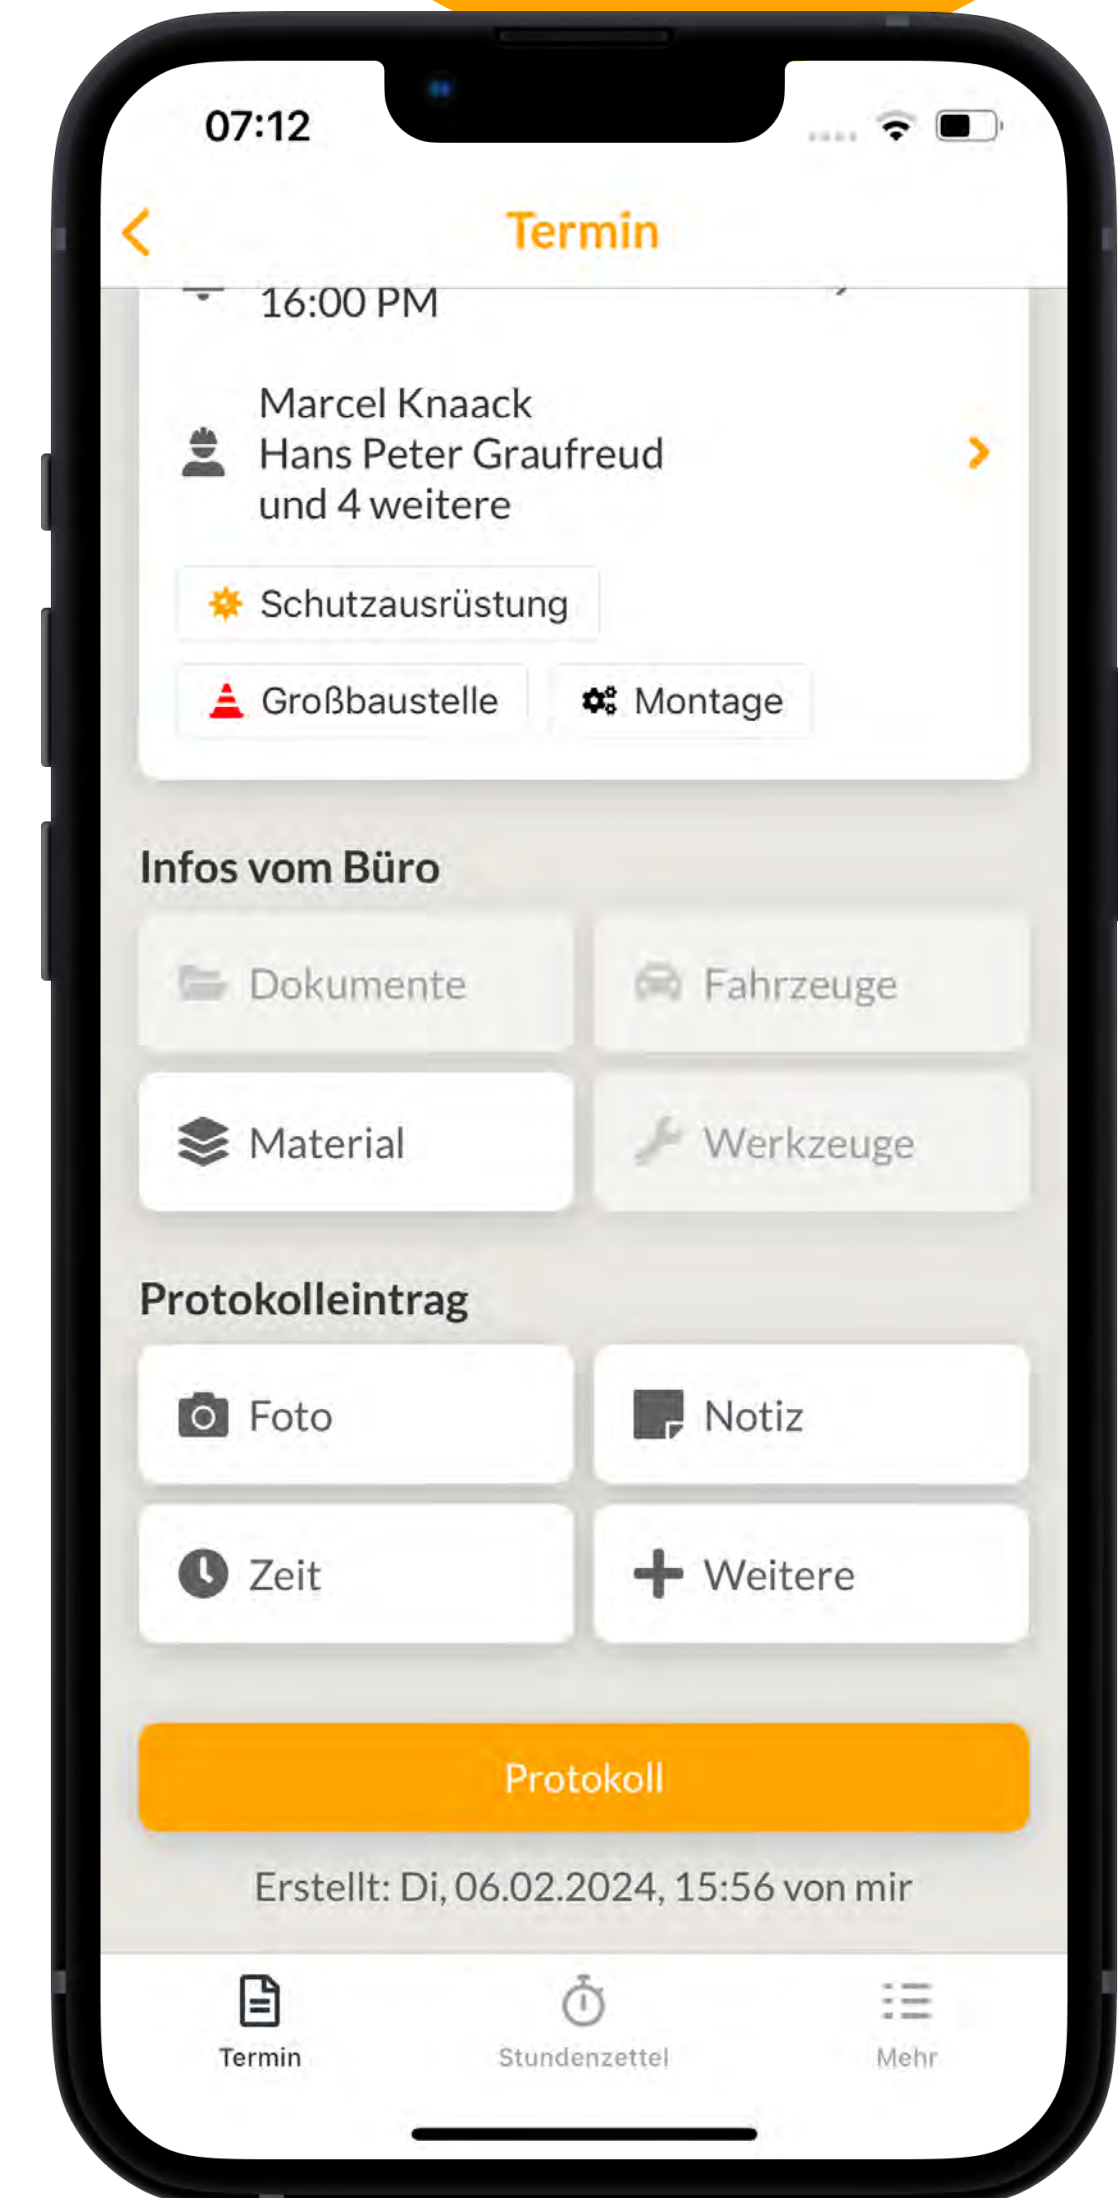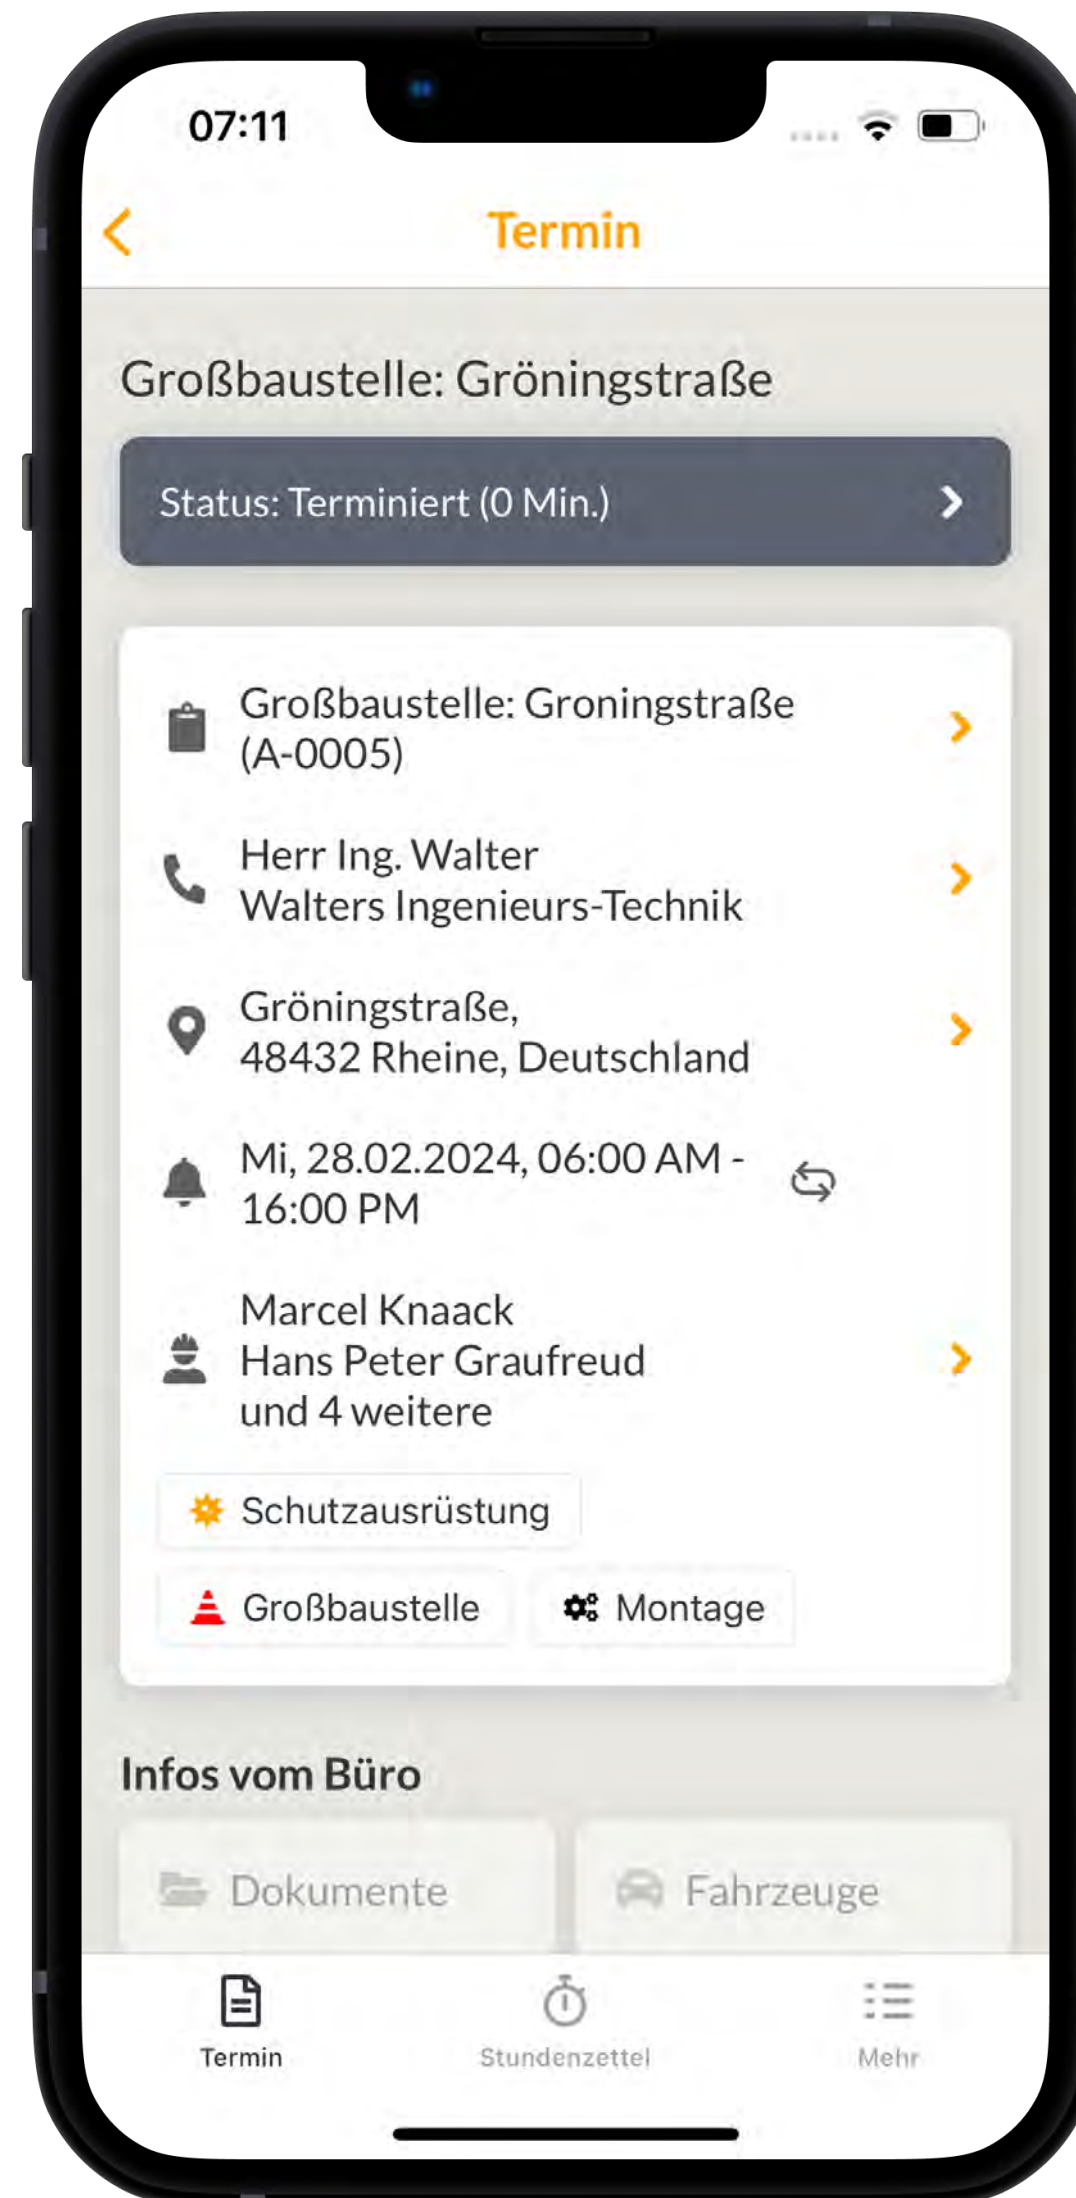

Erfasst.



Fast. Geschafft.

The screenshot displays the Craftbox software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Auftragsliste', 'Planung' (highlighted), 'Auswertung', 'Mitarbeiter', 'Stammdaten', and 'Adminbereich'. On the right side of the top bar, there is a notification icon with '16' and a user profile icon 'MK'. The main area is a calendar for 'KW 9 / Feb - Mar' with columns for days from Saturday 24 to Friday 5. Employees listed on the left include Franz Schneider (FS), Hans Peter Grauf... (HG), Jochen Viehtreiber (JV), Julius Brenneister (JB), and Marcel Knaack (MK). A red arrow points to a task block for Jochen Viehtreiber on Thursday, February 29th, labeled 'Ganztägig Montage'. The right sidebar shows 'Nicht terminiert (2)' with a search bar and two task cards for 'Montagetermine' for 'Frau Zimmermann, Grüntaler Grundst'.

Fast. Geschafft.

The screenshot displays the 'Auftragsliste' (Order List) section of the Craftbox software. The interface includes a top navigation bar with options like 'Planung', 'Auswertung', 'Mitarbeiter', ' Stammdaten', and 'Adminbereich'. The main content area shows a list of four construction orders for 'Großbaustelle: Gröningstraße' at '48432 Rheine'. Each order entry includes a status icon (calendar for 'Terminiert', checkmark for 'Fertig'), a 'Schutzausrüstung' (Safety Equipment) button, a 'Großbaustelle' (Construction Site) button, a 'Montage' (Assembly) button, the date and time (06:00 - 16:00), the location, resource allocation icons (FS, HG, JV, JM, +2), and a summary of hours (48h 0m). A 'Bearbeiten' (Edit) button is visible in the top right corner of the list area.

Status	Order Name	Equipment	Activity	Date/Time	Location	Resources	Hours
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung	Großbaustelle, Montage	Mi. 20.03.2024 06:00 - 16:00	Gröningstraße 48432 Rheine	FS, HG, JV, JM +2	48h 0m 0h 0m
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung	Großbaustelle, Montage	Mi. 13.03.2024 06:00 - 16:00	Gröningstraße 48432 Rheine	FS, HG, JV, JM +2	48h 0m 0h 0m
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung	Großbaustelle, Montage	Mi. 06.03.2024 06:00 - 16:00	Gröningstraße 48432 Rheine	FS, HG, JV, JM +2	48h 0m 0h 0m
Fertig	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung	Großbaustelle, Montage	Mi. 28.02.2024 06:00 - 16:00	Gröningstraße 48432 Rheine	FS, HG, JV, JM +1	50h 0m 40h 0m 10h 0m

Fast. Geschafft.

The screenshot displays the Craftbox software interface. The main window shows a list of tasks for 'Großbaustelle: Gröningstraße'. The tasks are categorized by status: 'Terminiert' (planned) and 'Fertig' (finished). Each task entry includes a date and time range, and is associated with specific activities like 'Montage' and 'Schutzausrüstung'. A detailed view of a task is shown on the right, featuring a table of 'Auftragszeiten' (task times) and a 'Protokoll' (protocol) section with a signature and date.

Craftbox Auftragsliste Planung Auswertung

Auftrag ? zurück zur Liste

Status	Terminiert	Fertig
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße 06:00 - 16:00 Mi. 20.03.2024	Großbaustelle: Gröningstraße 06:00 - 16:00 Mi. 28.02.2024
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße 06:00 - 16:00 Mi. 13.03.2024	
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße 06:00 - 16:00 Mi. 06.03.2024	

Auftragszeiten

	Dieser Termin	Auftrag	
Eingeplant	50h 0m	von 242h 0m	
Gebucht	40h 0m	von 40h 0m	Zum Protokoll
Abweichung	10h 0m	von 10h 0m	

Protokoll Neuer Protokolleintrag

Summe: Arbeitszeit: 40h 0m ● Pausenzeit: 0h 0m ● Fahrtzeit: 0h 0m

Abnahme - Akzeptiert ohne Anmerkungen heute, 08:35
Die Leistung ist mangelfrei, vertragsgerecht und es wurden keine Schäden am Inventar verursacht. **MK** Marcel K...

Herr Walter Abnehmender
Marcel Knaack Ausführender

Fast. Geschafft.

The screenshot displays the Craftbox software interface. The main window shows an order list with the following details:

Status	Location	Activity	Start Date	Time
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung, Großbaustelle, Montage	Mi. 20.03.2024	06:00 - 16:00
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung, Großbaustelle, Montage	Mi. 13.03.2024	06:00 - 16:00
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung, Großbaustelle, Montage	Mi. 06.03.2024	06:00 - 16:00
Fertig	Großbaustelle: Gröningstraße	Schutzausrüstung, Großbaustelle, Montage	Mi. 28.02.2024	06:00 - 16:00

An overlay window titled "Auftrags-PDF erzeugen" is open, showing options for PDF generation:

- Für die Akte * (Alle Informationen - als ZIP-Datei)
- Für den Kunden * > PDF anpassen

Below these options, a section titled "Welche Termine sollen auf dem PDF erscheinen?" lists the dates and activities for each order, with checkboxes to select which ones to include in the PDF:

- Alle
- Mi. 28.02.2024
Großbaustelle: Gröningstraße (Activities: Großbaustelle, Montage, Schutzausrüstung)
- Mi. 27.03.2024
Großbaustelle: Gröningstraße (Activities: Großbaustelle, Montage, Schutzausrüstung)
- Mi. 20.03.2024
Großbaustelle: Gröningstraße (Activities: Großbaustelle, Montage, Schutzausrüstung)
- Mi. 13.03.2024
Großbaustelle: Gröningstraße

Geschafft.

The screenshot displays the Craftboxx software interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Craftboxx', 'Auftragsliste' (highlighted), 'Planung', 'Auswertung', 'Mitarbeiter', 'Stammdaten', and 'Adminbereich'. On the right side of the navigation bar, there is a notification icon with '16' and a user profile icon 'MK'.

The main content area is titled 'Auftrag' with a help icon and a link '← zurück zur Liste'. A 'Bearbeiten' button is located on the right. Below this, there are two sections: 'Auftragsliste' and 'Archiv (1)'. Each section contains a table of orders.

Status	Location	Order Type	Date	Time	Address	Personnel	Duration
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Großbaustelle	Mi. 13.03.2024	06:00 - 16:00	Gröningstraße 48432 Rheine	FS HG JV JM +2	48h 0m 0h 0m
Terminiert	Großbaustelle: Gröningstraße	Großbaustelle	Mi. 06.03.2024	06:00 - 16:00	Gröningstraße 48432 Rheine	FS HG JV JM +2	48h 0m 0h 0m
Archiviert	Großbaustelle: Gröningstraße	Großbaustelle	Mi. 28.02.2024	06:00 - 16:00	Gröningstraße 48432 Rheine	FS HG JV JM +1	50h 0m 40h 0m 10h 0m

Each order entry includes a calendar icon, a 'Terminiert' or 'Archiviert' status, a location name, a red 'Großbaustelle' tag, a 'Montage' tag, a yellow 'Schutzausrüstung' tag, a date and time range, a location pin, an address, personnel icons (FS, HG, JV, JM, +2 or +1), and duration information.

Testet selbst.

